

Point d'étape

Janvier 2021

**Construire une alliance de gouvernements locaux pour la
résilience des villes frappées par des catastrophes naturelles
Asie-Pacifique, ville de Palu, Sulawesi central,
Indonésie**



Objectifs	Résultats obtenus	Activités	Etat
1. Améliorer l'efficacité du système d'alerte précoce (SAP) et la coordination avec les acteurs locaux	1.1 Recommandation pour le système d'alerte rapide aux tsunamis de la ville de Palu	- Formation pour l'Agence locale de gestion des catastrophes de Palu sur l'engagement communautaire des SAP	Report dû à la COVID-19. Résultats attendus d'ici février 2021
	1.2 Cartographie des acteurs et identification des besoins	- Réunion de coordination avec le gouvernement de la ville de Palu pour la mise à jour des besoins (BPBD, Bappeda, PU, etc.) et la cartographie des acteurs du secteur humanitaire. - Webinaire : Booster les petites et moyennes entreprises après la catastrophe (cas de la ville de Palu) : 28 septembre 2020	Achévé
2. Construire des équipements publics et soutenir le développement économique locale (DEL)	2.1 - Parc mémoriel pour la commémoration des catastrophes dans la ville de Palu	- Coordination avec le PUPR, Bappenas, MOHA (déblayage et localisation du site) - Consultation publique préliminaire pour une approche participative avec la communauté des anciens liquéfacteurs pour la conception du parc commémoratif - Consultation publique approfondie pour la construction du parc commémoratif - Conception technique détaillée - Appels d'offres et marchés publics - Premiers travaux pour le site du parc commémoratif - Processus de transfert	En discussion avec la municipalité pour l'emplacement
	2.2 Sélection de trois propositions de DEL à Palu	- Mécanisme de sélection des propositions et critères pour DEL - Entretiens approfondis avec les membres de la proposition de DEL choisie. - Annonce des DEL sélectionnés. - Atelier de formation sur la capacité des modèles d'entreprise.	Achévé en décembre 2020

3. Assurer le développement des capacités et formation	3.1. Révision du plan de relance de Palu	- Atelier de formation pour renforcer les capacités des gouvernements locaux en matière de redressement et de reconstruction	Report dû à la COVID-19 Résultats attendu d'ici février-mars 2021
	3.2. Note d'apprentissage et présentation des bons processus	- Atelier d'apprentissage par les pairs sur la construction d'une alliance des gouvernements locaux et la résilience des villes confrontées au risque dans les zones côtières (cas du tremblement de terre, du tsunami et de la liquéfaction de 2018 à Palu)	Report dû à la COVID-19 (en attente des retours de la ville de Palu) Informations attendues d'ici février 2021

- I. Cartographie des acteurs
- II. Soutien au développement économique Local (DEL)
- III. Infrastructures publiques
- IV. Renforcement des capacités et formation

Résultats de la cartographie des acteurs

L'analyse de la cartographie des acteurs est une demande de l'Agence de gestion des catastrophes de Palu (BPBD) qui a besoin de toute urgence d'identifier les principaux acteurs travaillant dans le domaine de l'aide post—catastrophe à Palu.


Principales conclusions :

- La plupart des ONG ont des projets en dehors de la ville de Palu (districts administratifs ruraux comme Donggala, Sigi Rengency. Le soutien et l'engagement sont plus faciles ou plus importants en dehors de Palu. Les ONG ont fait part de réactions très lentes dans la gestion de la crise et de l'absence de coordination claire entre les différents services de la ville

-Les projets de réhabilitation à Palu sont principalement axés sur les aspects structurels (construction de maisons de plein pied) qui devaient être achevé d'ici 2020. Selon les le BPBD, entre 200 et 400 maisons seulement seront construites d'ici la fin du mois d'avril, un écart conséquent par rapport à l'objectif initial (4000 maisons doivent être construites.

-Concernant les moyens de subsistance, le programme n'est pas très important et se concentre sur des versements directs (argent pour les dépenses quotidiennes) plutôt que sur les dons indirects (soutien aux PME, bateau pour les pêcheurs, besoins de base, nutrition, réaménagement des magasins et des marchés...)

-Les programmes d'éducation et de santé comptent deux axes: physique (reconstruction d'écoles, construction d'un centre de santé communautaire et d'un hôpital) et non-physique (campagne de retour à l'école, dons de fournitures scolaires aux élèves et plan de sauvegarde de l'école, offrant une consultation pour la guérison des traumatismes). Le projet de reconstruction WASH est l'un des enjeux des nouvelles habitations permanentes.

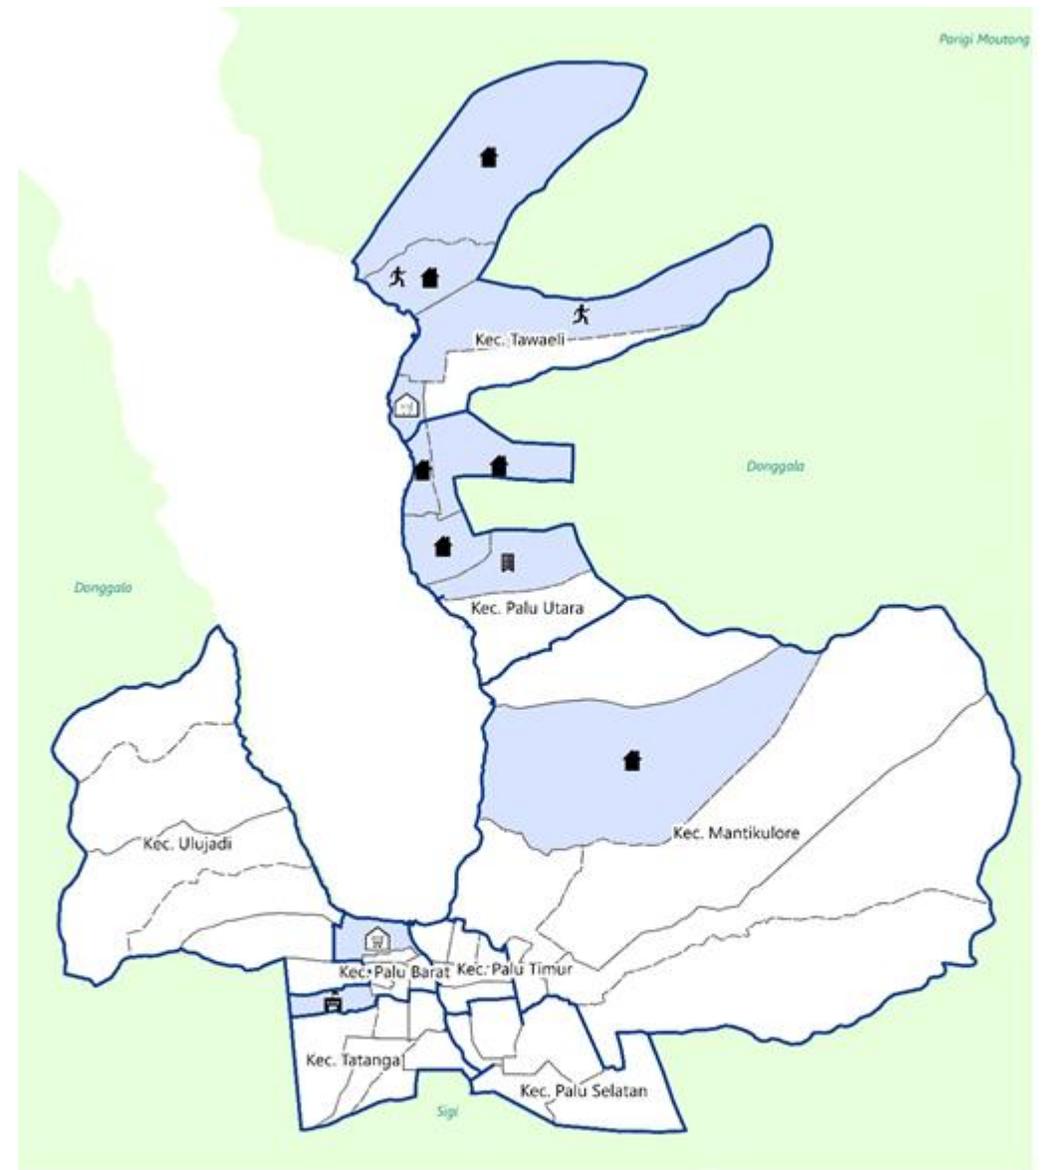

Limites administratives

- Limites de la municipalité
- Limites des villages urbains
- Limites des districts

Nature de l'aide

- Renforcement des capacités
- Abris provisoires
- Résidences permanentes
- Constructions
- Moyens de subsistance

Répartition de l'aide d'urgence dans la ville de Palu, Indonésie



KUBE-Local Economic Recovery (LED)

No.	Projets de DEL sélectionnés	Type d'activité
1	Lingkar Hijau	Ferme urbaine et résilience (gestion des déchets et agriculture)
2	Boulangerie Arsyilah (Balaroo)	Boulangerie promouvant l'emploi féminin
3	Imprimerie Gawalise (Balaroo)	Imprimerie textile encourageant l'employ des jeunes

❑ LA COMMUNAUTE DE LINGKAR HIJAU



La communauté de Lingkar Hijau a été créée en 2018, juste après le tsunami qui a frappé Palu. Sa mission est de promouvoir un mode de vie urbain respectueux de l'environnement et de renforcer la participation de la communauté à la sécurité alimentaire et à la durabilité. Les cinq fondateurs sont conscients de l'importance de la sécurité alimentaire et de la résilience après une catastrophe et se basent sur l'expérience de la catastrophe de 2018: Palu a en effet été confrontée à une pénurie et une insuffisance alimentaire qui a déclenché des émeutes de la faim.

- Agriculture urbaine et agriculture pour la communauté ;
- Gestion des déchets (recyclage des déchets organiques) ;
- Recyclage et réutilisation des matériaux de seconde main tels que les cannettes, les plastiques et les bouteilles.

❑ L'IMPRIMERIE GAWALISE



L'imprimerie Gawalise est située dans le village de Balaroa, l'une des zones de la ville de Palu durement touchées par la liquéfaction. L'imprimerie a été créée par cinq personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la catastrophe de 2018. L'idée est venue de l'un des fondateurs qui a de l'expérience dans ce domaine.

Les activités de l'imprimerie Gawalise :

- Impression et conception de vêtements
- Service de conception de bannière et de fond de scène

□ BOULANGERIE ARSYILA



La boulangerie Arsyila a été créée par cinq femmes au foyer du village de Balaroa. La boulangerie a été créée avant la catastrophe (2010) par Mme Nuraini. Les revenus dépendaient alors des commandes quotidiennes du marché traditionnel voisin (Balaroa Market). Mme Nuraini a montré sa volonté de diriger l'entreprise et peut se prévaloir d'une expérience en boulangerie ainsi que de certaines attentes par rapport à ce programme. Elle a mentionné que les gâteaux et la boulangerie étaient vendus uniquement au marché traditionnel chaque jour et fabriqués sur commande. Elle a également mentionné la possibilité d'utiliser le marketing en ligne, par le biais de Facebook ou d'Instagram. À l'avenir, le plan prévoit de vendre les produits sur les marchés locaux en ligne tels que Go-food et Grab-food.

Construction d'infrastructures publiques



- Le mémorial sera situé dans le district de Balaroa et, selon la dernière coordination avec l'administration du district, il peut être possible de revitaliser l'espace public actuel (site de restauration abandonné pour les villageois et construit par la JICA en 2019).
- Selon le représentant du ministère des travaux publics à Palu, la coordination devrait se faire avec le maire nouvellement élu à la mi-février.
- L'allure générale devrait être celle d'un bâtiment traditionnel en espace ouvert pouvant être utilisé pour les rencontres entre le gouvernement et les habitants du village. Il peut être utilisé comme point d'urgence et comme espace public pour le mémorial de la catastrophe de Balaroa (voir photos).
- La construction devrait se dérouler entre avril et mai 2020.

Renforcement des capacités et formation

- Atelier de renforcement des capacités du KUBE est prévu en février-mars.
- Formation à l'analyse des risques et des indices de vulnérabilité pour la zone à l'échelle locale, y compris de la stratégie d'alerte précoce pour les catastrophes de type local. Un atelier de formation sera programmé en février-mars.
- Apprentissage par les pairs doit avoir lieu en mai 2021 (après le Ramadan). La construction des installations publiques devrait être achevée.

Dernières informations

- Le BPBD a demandé à soutenir l'analyse de l'indice de risques et la stratégie SAP pour la zone locale de Palu.
- Le département des affaires sociales de Palu a demandé le soutien de la construction d'une maison pour les habitants sans domicile (budget approximatif de 25 000 USD).



Cités Et Gouvernements Unis Asie-Pacifique

Jakarta's City Hall Building E, 4ème étage

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

Jakarta – Indonesie

www.uclg-aspac.org

@uclgaspac



uclgaspac



uclgaspac

